


# Projekt Sanierung Schulzentrum Lechenich

## Termine und Ausführung

### Übersicht Planung und Bauausführung

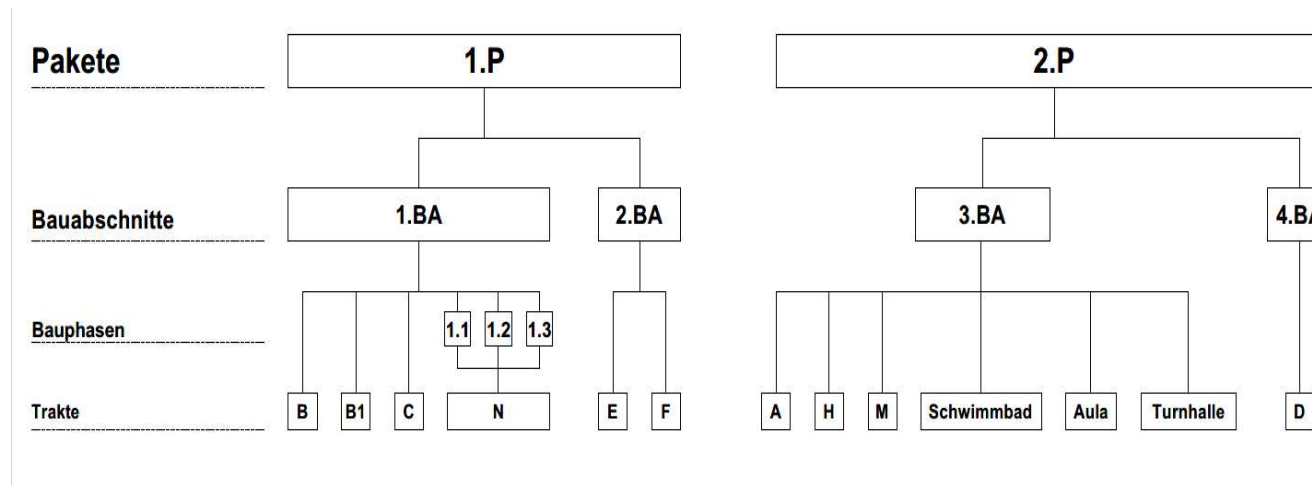

**Termine Pakete und Gesamtfertigstellung:**

Baubeginn 1. Paket		Baubeginn 2. Paket		Fertigstellung	
Soll	4.Quartal 2021	Soll	3.Quartal 2024	Soll	4. Quartal 2027
Ist	4.Quartal 2021	Ist	2.Quartal 2025	Ist	4. Quartal 2027

**Termine und Ausführung Trakte für den 1.BA:**

Baubeginn B Trakt		Fertigstellung B Trakt		Baubeginn B1 Trakt		Fertigstellung B1 Trakt	
Soll	1.Quartal 2022	Soll	4.Quartal 2023	Soll	1.Quartal 2022	Soll	4.Quartal 2023
Ist	1.Quartal 2022	Ist	2.Quartal 2024	Ist	1.Quartal 2022	Ist	3.Quartal 2024

Baubeginn C Trakt		Fertigstellung C Trakt		Baubeginn N Trakt		Fertigstellung N Trakt	
Soll	1.Quartal 2022	Soll	4.Quartal 2023	Soll	4.Quartal 2021	Soll	4.Quartal 2023
Ist	1.Quartal 2022	Ist	3.Quartal 2024	Ist	4.Quartal 2021	Ist	2.Quartal 2024
